


Kyrölään päiväkoti ja koulu infotilaisuus

Ke 17.1.2024 kello 18:00-19:00
Järvenpään yhteiskoulu, ruokasali, Kansakoulunkatu 1

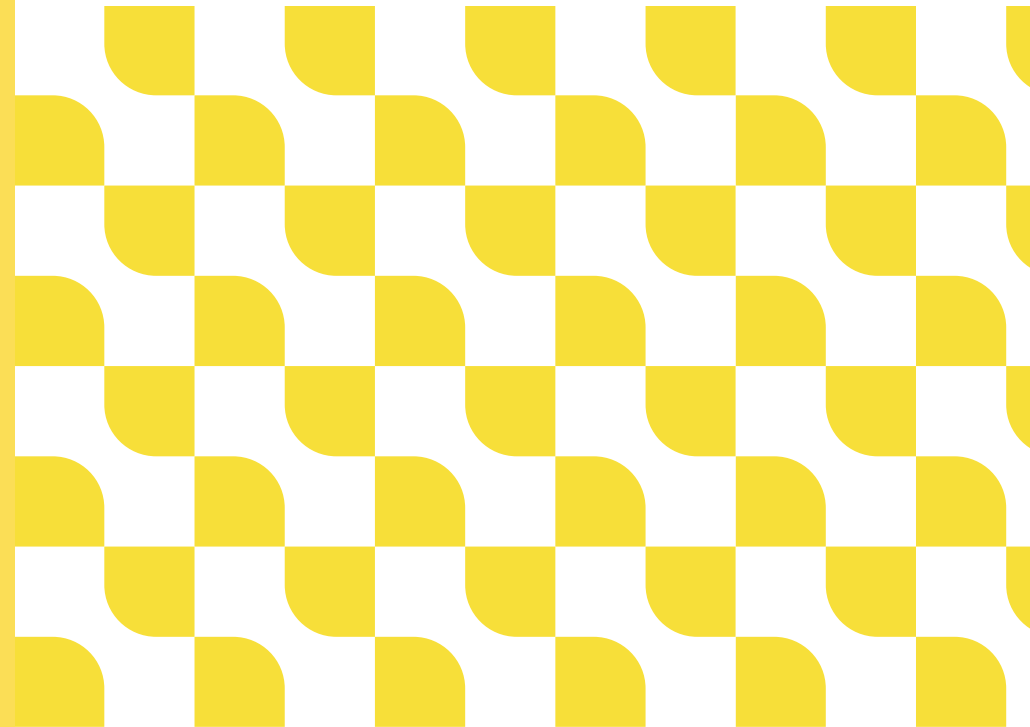


Tilaisuuden kulku




- **Miten kysyt ja kommentoit**
(Jan Mikkonen)
- **Alkusanat**
(Jan Mikkonen, Katja Laitinen ja Asta Pekkala)
- **Kyrölän päiväkotiki ja koulun muutos- ja laajennustyöt**
Esittely ja aikataulu
(Janne Mannersalo Mestaritoiminta)
- **Keskustelua ja kysymyksiä**

*Tule kuulemaan ja kysymään
Kyrölän päiväkoti ja koulun
rakentumisesta.*

*Tilaisuudessa Järvenpään
kaupungin ja Mestaritoiminta
Oy:n edustajat kertovat
rakentamisen etenemisestä.*

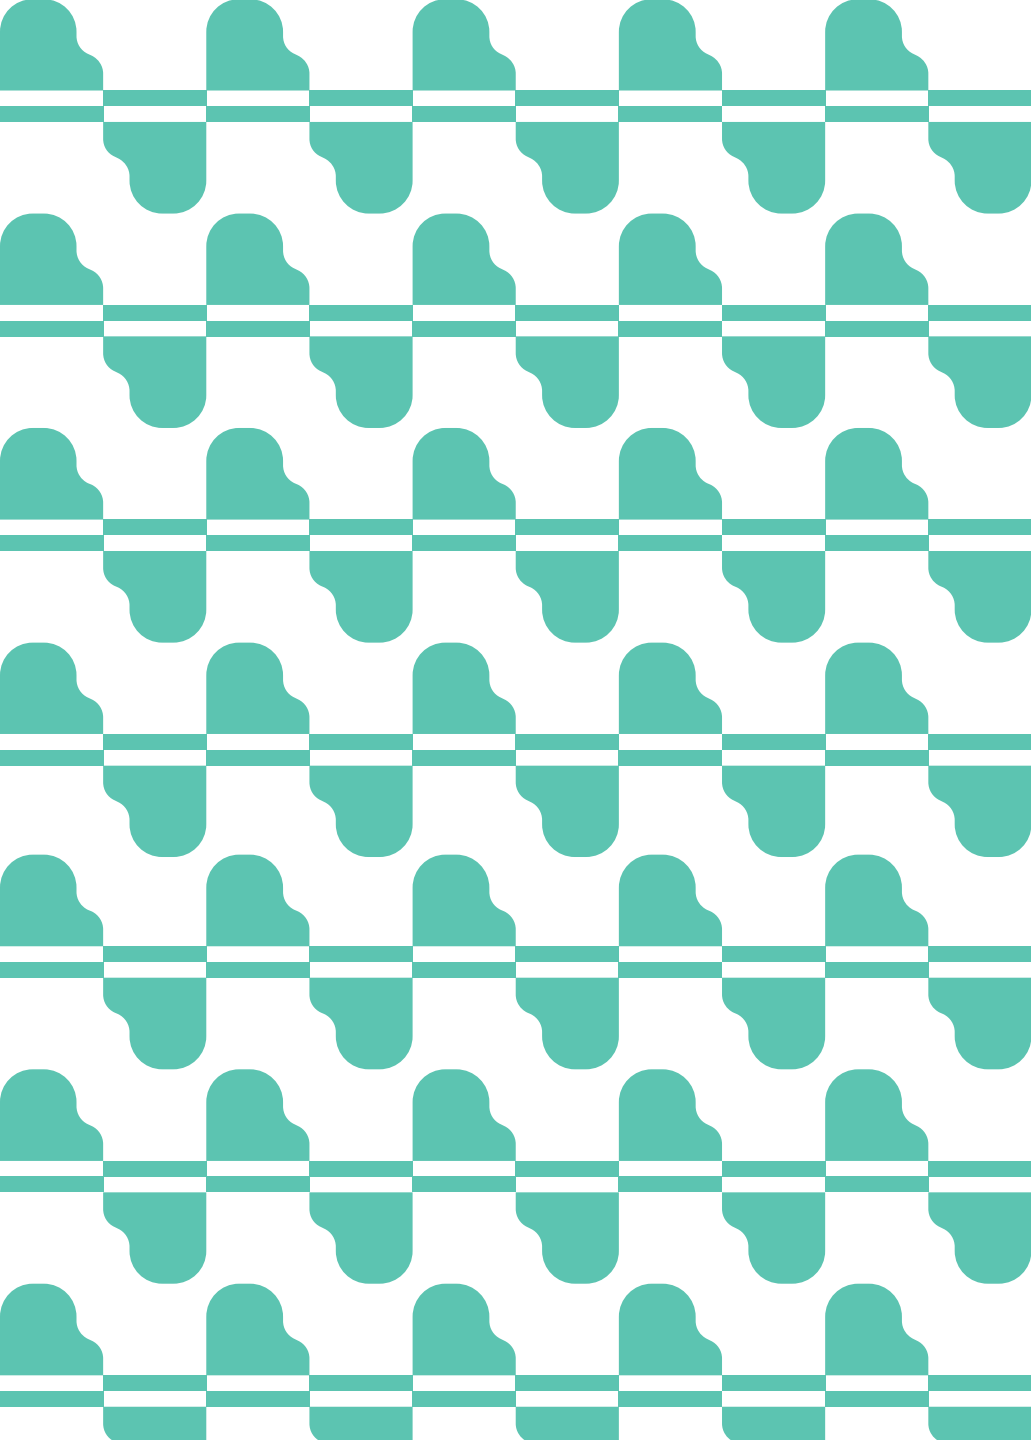

Kyrölän päiväkodin ja koulun muutoksen toteutus

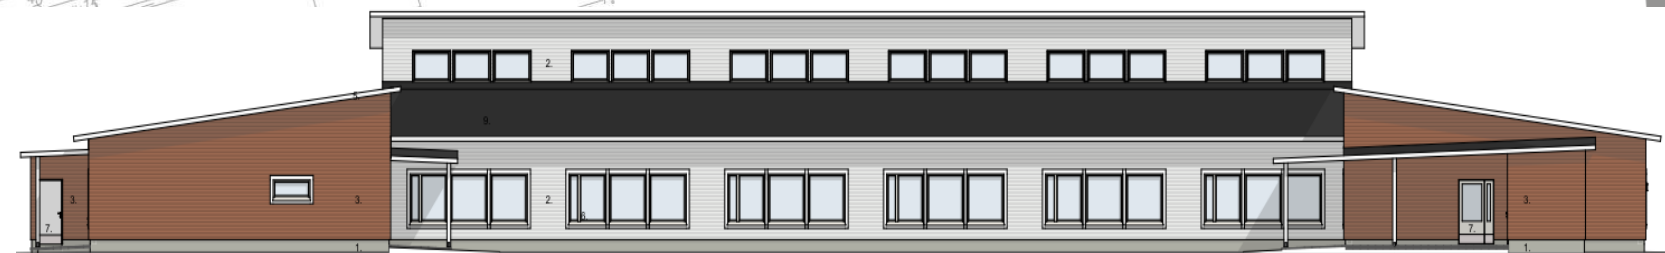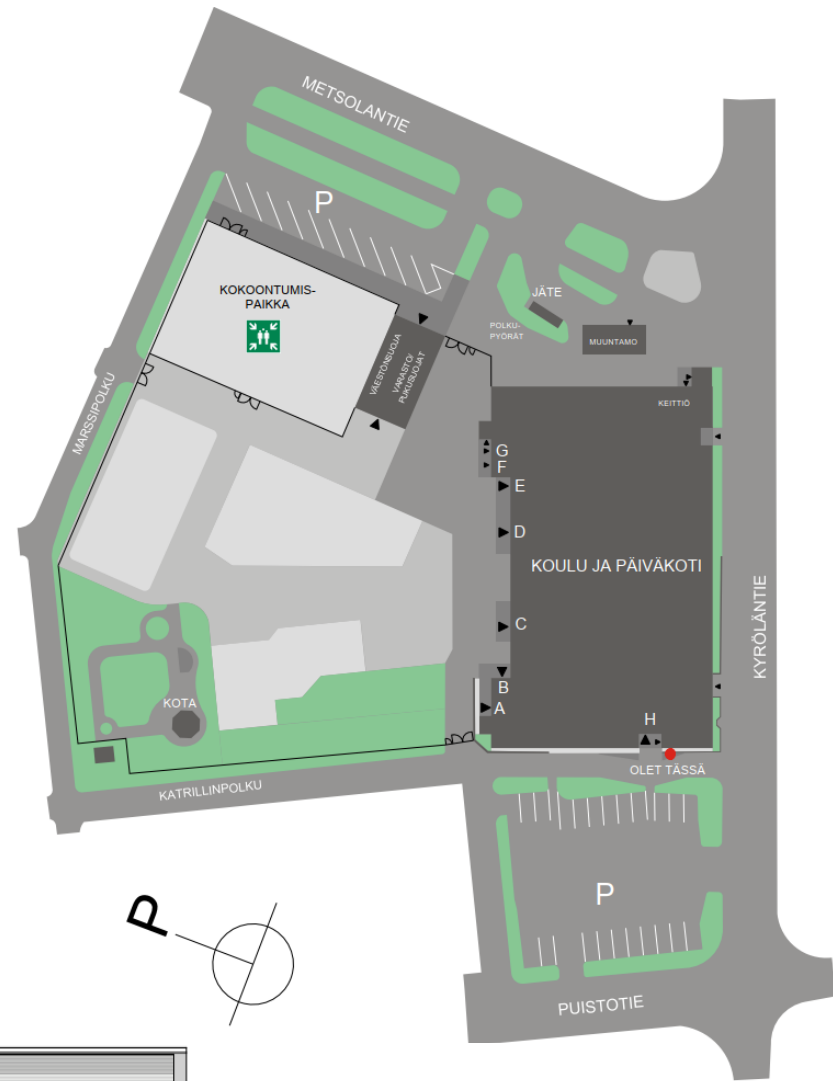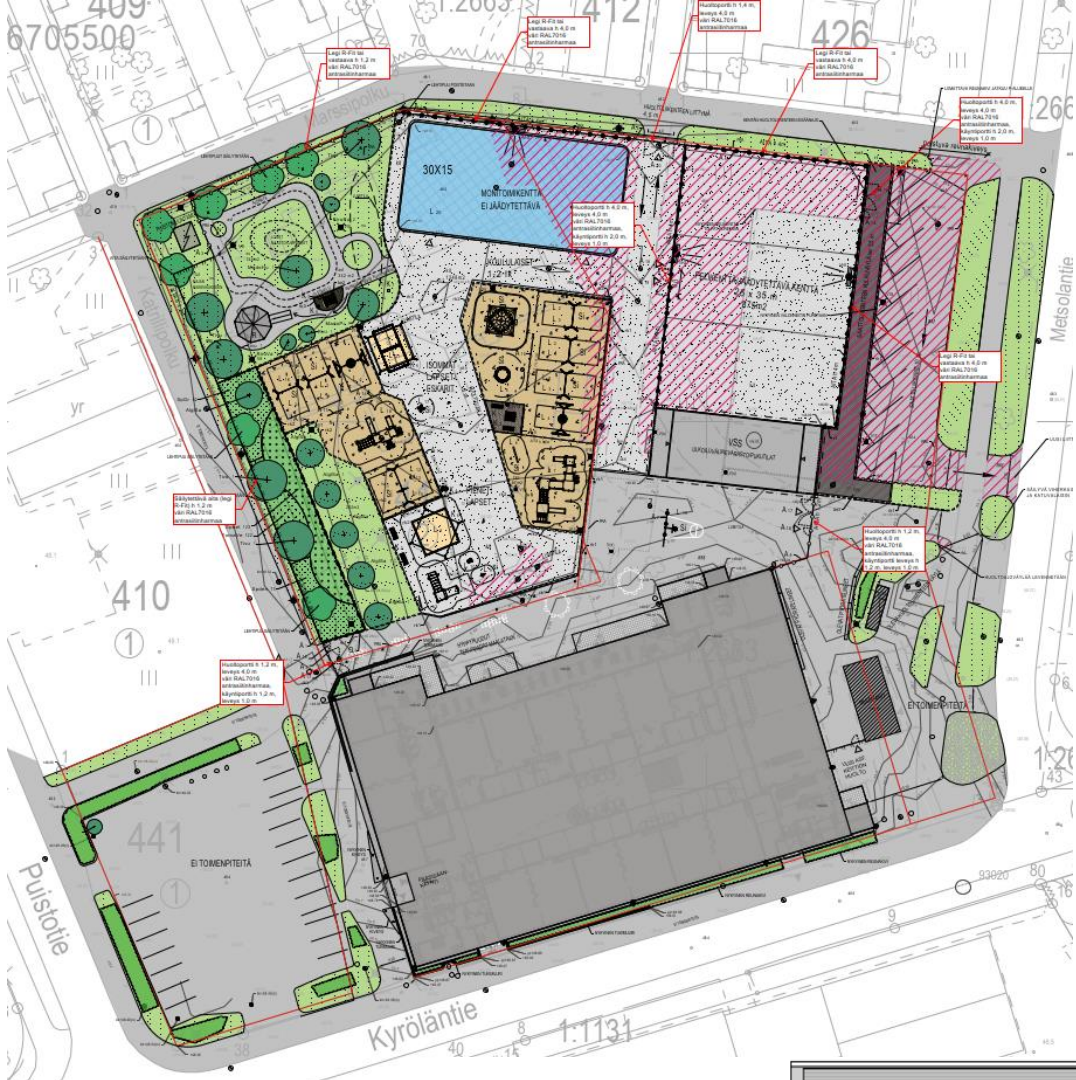

Kyrölän koulun muutostöiden tiivistelmä


- Koulu muutetaan pienten lasten yksiköksi.
- 5 alakoululuokkaa ja käsityöluokka muutetaan päiväkodin tiloiksi. Päiväkotialueelle tehdään toiminnan vaatimat ryhmä-WC-tilat ja uusi eteisaula märkäeteisineen.
- 2 alakoululuokkaa otetaan esikoulu-ryhmien käyttöön.
- Nykyiselle Kyrölän koululle ei ole osoitettu väestösuoja. Kyrölän koulu on rakennettu väliaikaisella rakennusluvalla, joka ei edellytä väestösuojan rakentamista. Pysyvä rakennuslupa edellyttää mitoituksen mukaisen väestösuojan rakentamista.
- VSS-tiloihin rakennetaan pukuhuone- ja varastotilat, jotka palvelevat koulun, päiväkodin ja iltakäytön tarpeita.
- Kyrölän uuden yksikön piha-alueet (myös pois puretun Kyrölän päiväkodin alue) uudistetaan vastaamaan uuden yksikön muuntuneita tarpeita. Piha-alueelle tulee myös jäädytettävä kenttä ja monitoimikaukalo, jotka palvelevat ympäristön asukkaita lähiliikuntapaikkana.

Kyrölän koulun muutostyöt ja aikataulu


- Muutostyöt toteutetaan kolmena erillisurakkana
 - koulurakennuksen muutos- ja laajennustyöt
 - VSS-rakennus
 - pihaurakka
- Kyrölän päiväkodin purkutyöt, hulevesien viivytyslinjat ja laajennusosan maanrakennustyöt toteutuivat kesällä 2023
- Koulurakennuksen muutostyöt aloitettiin kesäkuussa 2023, laajennusosan moduulit asennettiin marraskuussa 2023. Tämä urakkakokonaisuus valmistuu viimeistään 30.4.2024. Näin ollen henkilökuntaa pääsee valmistautumaan toiminnan aloitukseen hyvissä ajoin.
- VSS-rakennuksen sekä pihaurakan aloitus on viivästynyt erinäisistä syistä johtuen. Näiden urakoiden täysipainoinen toteutus alkaa huhtikuussa 2024, kun routa on sulanut.
- Sekä VSS-rakennus, että pihaurakka valmistuu viimeistään 2.8.2024
- Kyrölän päiväkotia ja koulu otetaan käyttöön 8/2024

*Valmistuminen ja
käyttöönotto*

Pohjapiirustus

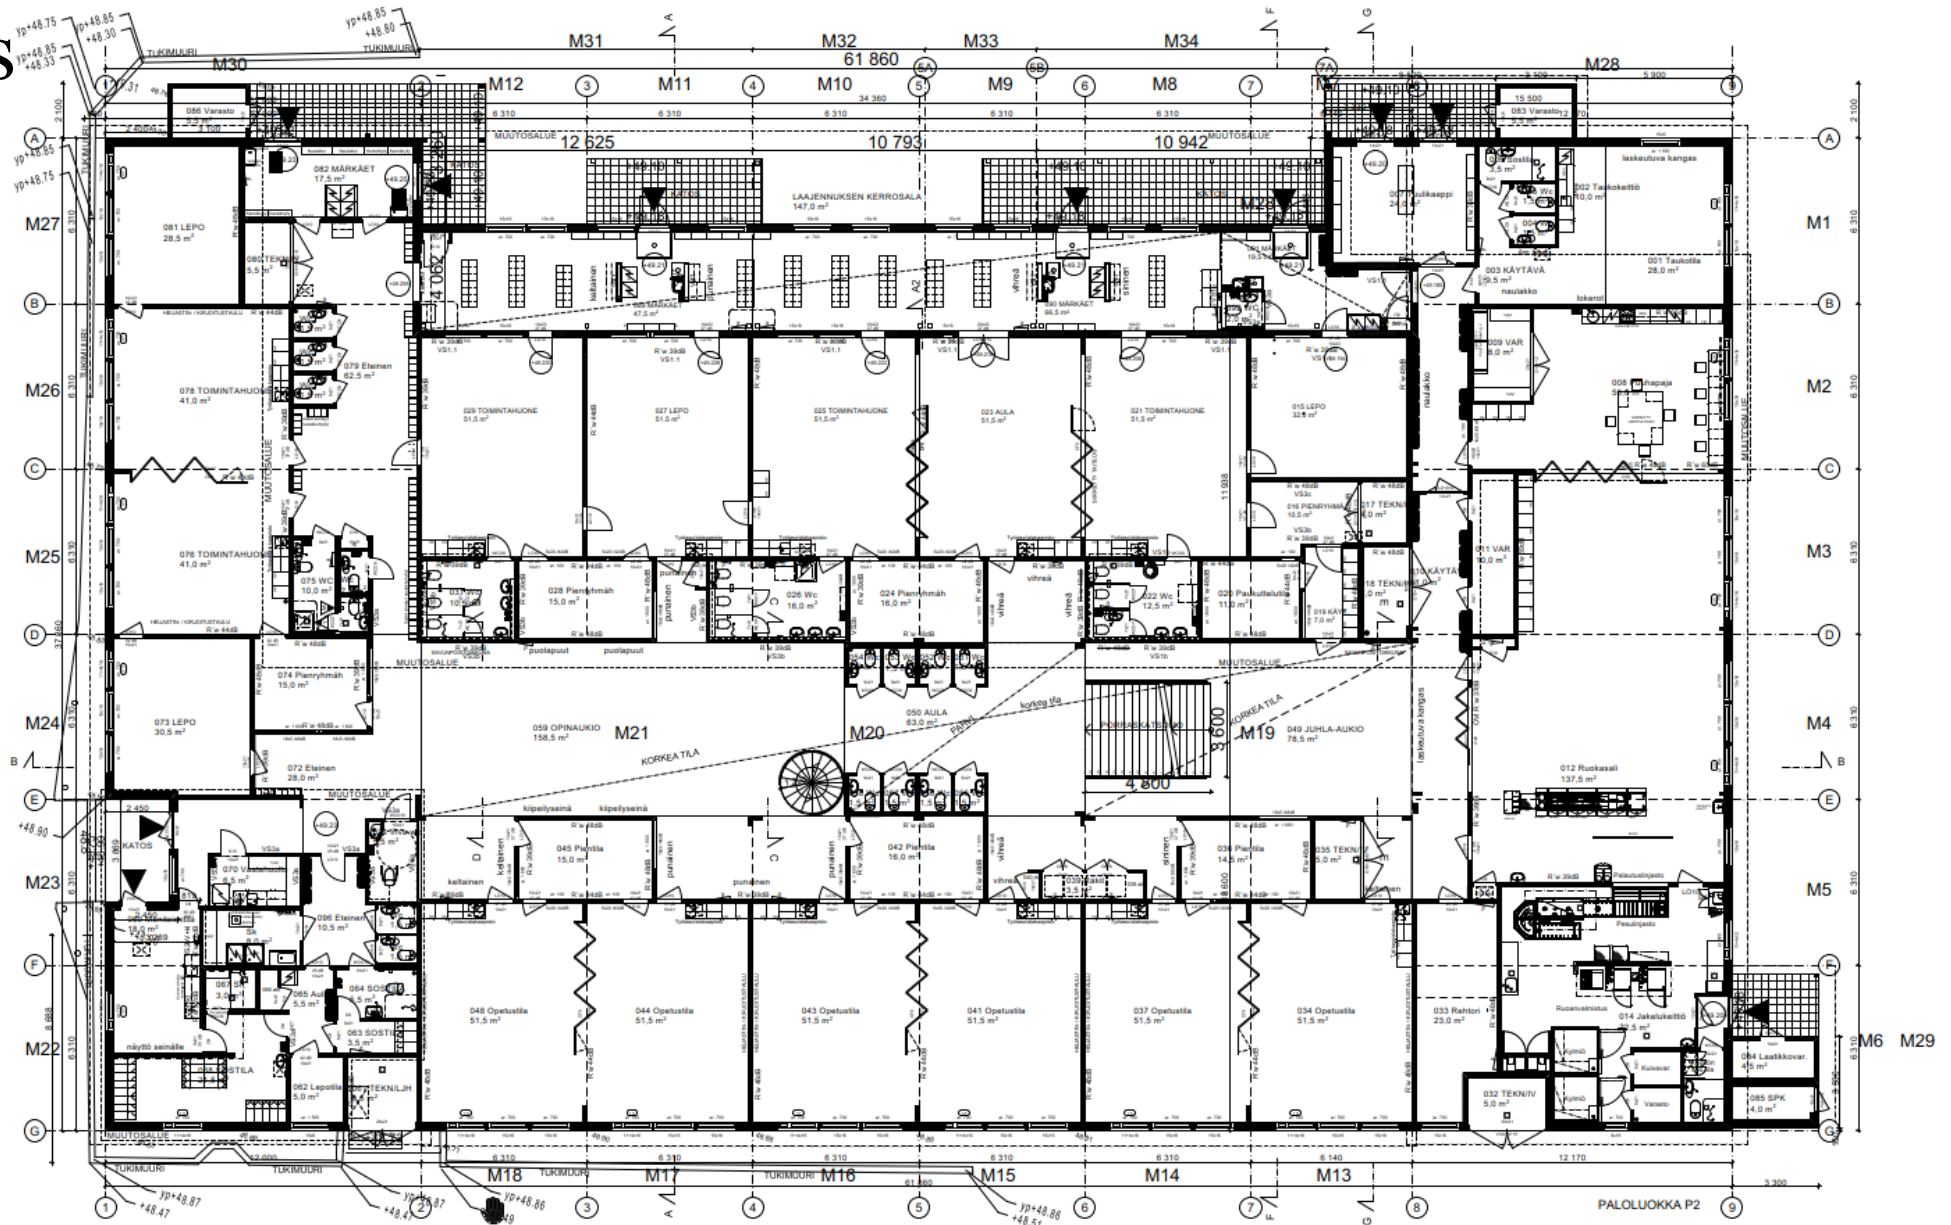

Suunnitelmien mukainen saattoliikenne

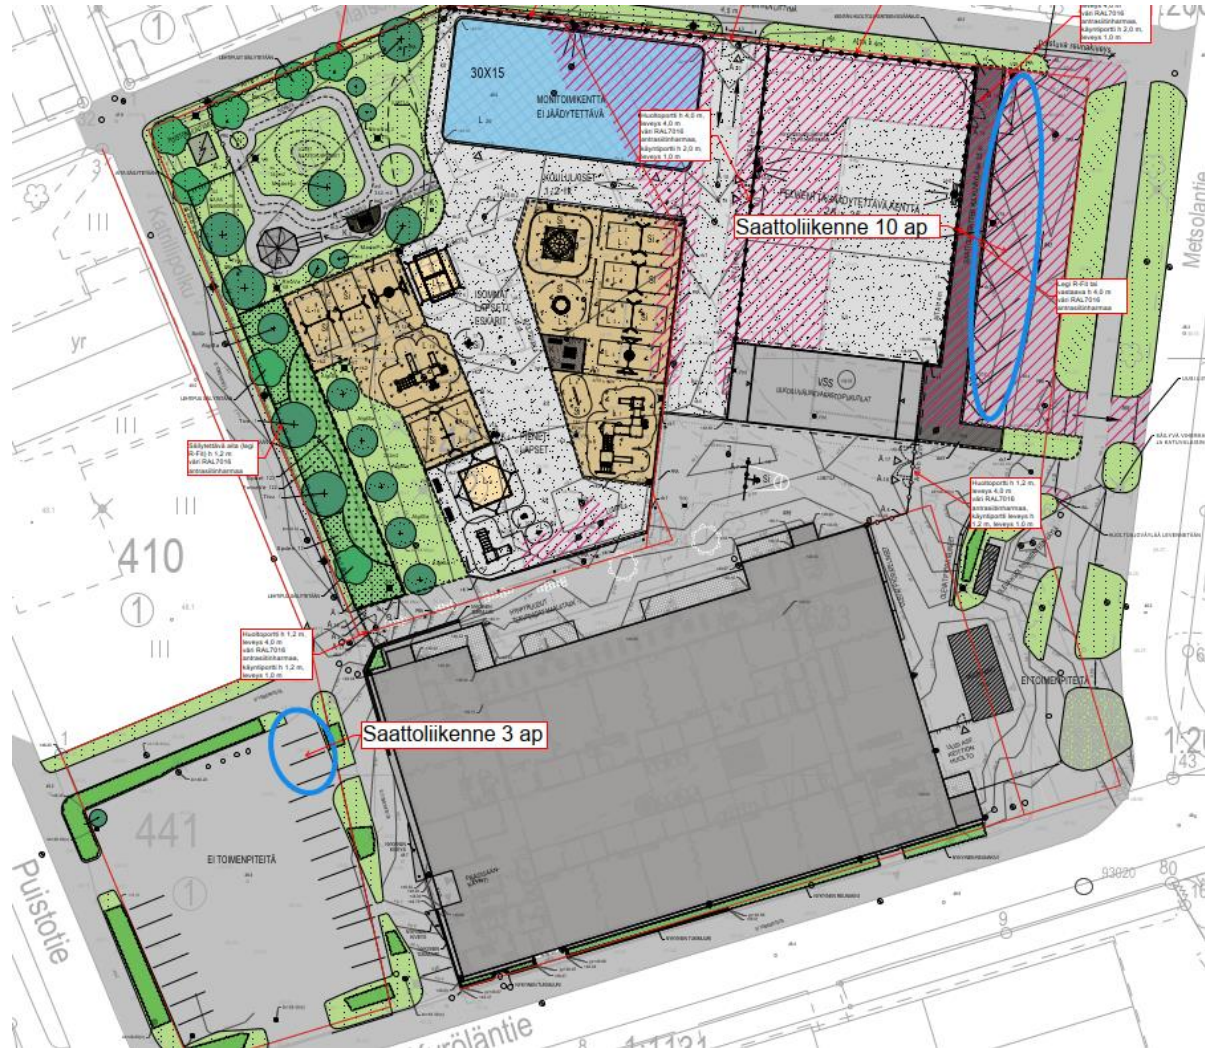

*Päiväkodin ja koulun
saattoliikenne*

Kysy ja kommentoi

- Janne Mannersalo, projektipäällikkö, Mestaritoiminta Oy
janne.mannersalo@mestaritoiminta.fi
- Pia Pohjanpalo, rehtori Järvenpään kaupunki
pia.pohjanpalo@jarvenpaa.fi
- Maritta Mäkipää, Järvenpään kaupunki
maritta.makipaa@jarvenpaa.fi
- Asta Pekkala, virka-apulaisrehtori, Järvenpään kaupunki
asta.pekkala@jarvenpaa.fi
- Katja Laitinen, päiväkodin johtaja, Järvenpään kaupunki
katja.laitinen@jarvenpaa.fi

13.2.2024

Kiitos osallistumisestasi!

Ole yhteydessä

jan.mikkonen@jarvenpaa.fi
